




GUÍA VISUAL • ENCUENTRO DE TALLER • SUITE SOLTEIN SAAS

Proyecto

Encuentro 2: Replanificación, seguimiento y costos del proyecto. Gestión y administración empresarial • Operaciones.

Encuentro 2 de 3 **Odoo 19**

para estudiar solo o con instructor con la Suite Soltein

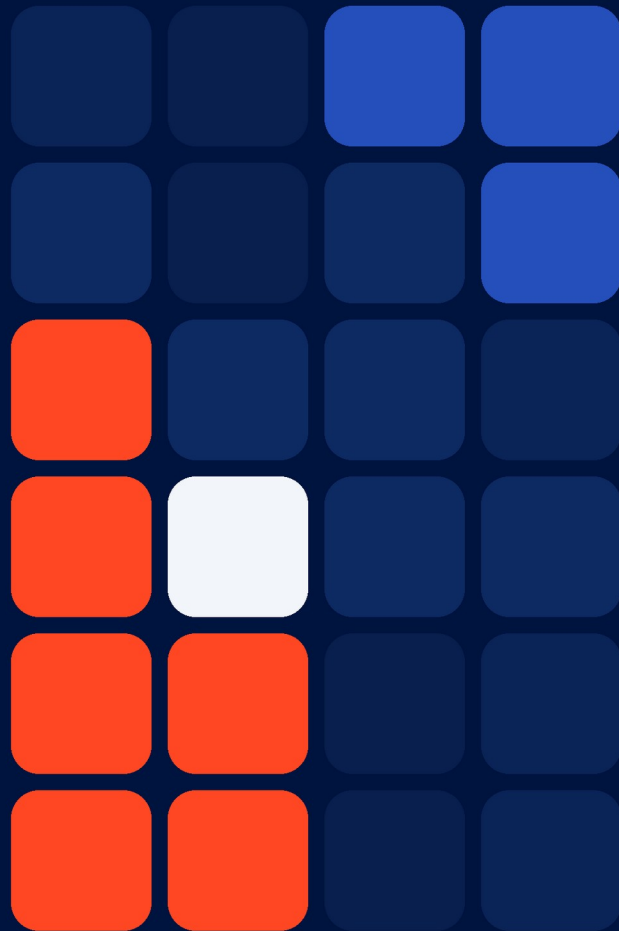

Encuentro 2: Replanificación, seguimiento y costos del proyecto



Proyecto · encuentro 2 de 3 · 2 horas · agenda de trabajo con el cliente

Tiempo	Bloque	Qué se hace en el encuentro
0:00–0:10	Apertura	Dinámica · Dudas de los videos 3 y 4 y cómo reacomoda hoy el cliente sus proyectos
0:10–0:30	Replanificar un proyecto	Práctica · Asistente con nombre, fecha, punto de partida y motivo
0:30–0:45	Tareas afectadas y dependencias	Práctica · Revisión del impacto antes de confirmar
0:45–0:55	Pausa	
0:55–1:10	Historial y ruta crítica	Caso · Registro del cambio y tareas que no pueden retrasarse
1:10–1:30	Tiempos, progreso y variaciones	Práctica · Lectura del estado del proyecto desde su ficha
1:30–1:50	Objetivos y cuenta analítica	Práctica · Objetivos por fase y cuenta analítica para costos
1:50–2:00	Cierre	Cierre · Acuerdos, pendientes de configuración y tareas para la semana

SE APOYA EN LOS VIDEOS

- [Video 3 · Replanificación y ruta crítica](#)
- [Video 4 · Seguimiento, objetivos y costos](#)

YA LO VIERON EN VIDEO

- Asistente de replanificación con fecha, punto de partida y motivo, y revisión de las tareas afectadas
- Historial de replanificación y ruta crítica en el Gantt
- Tiempos, progreso, variaciones, objetivos y cuenta analítica del proyecto

RESULTADO DEL ENCUENTRO

Un cambio de plan revisado con su impacto y registro, y el seguimiento del proyecto con objetivos y cuenta analítica.

Ruta del encuentro: del cambio de plan al control del proyecto

Proyecto · encuentro 2 · Apertura



Al final: un cambio de plan revisado con su impacto, y el seguimiento del proyecto con objetivos y cuenta analítica.

Dinámica: qué pasa hoy cuando el plan cambia

Proyecto · encuentro 2 · Apertura

PRÁCTICA

10 min · Dinámica

¿Cómo reacomoda hoy el cliente las fechas cuando el proyecto se atrasa o el alcance cambia?

- 1 Anota el último cambio de fechas de un proyecto del cliente.
- 2 Anota quién se entera y cómo.
- 3 Anota cómo sabe hoy si el proyecto va bien o mal.
- 4 Anota qué costos del proyecto le gustaría ver.

SE LOGRA CUANDO

- Se identificó un caso real de cambio de plan.
- Se acordó qué indicadores quiere ver el cliente.

El proyecto y su botón Replanificar

Proyecto · encuentro 2 · Replanificar un proyecto

The screenshot displays the Soltein project management interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Proyectos', 'Tareas', 'Calendario', 'Reportes', and 'Configuración'. Below this, a sub-header shows the project name '99910 - 999.TEST Implementación ...' and a status bar with 'Tasks 0 / 8 (0%)', 'Ver horas 0', 'Etapas', 'Ruta crítica', 'Historial de Replanificación', 'Objetivos', and 'Dashboard 0 Estado'. A secondary bar contains buttons for 'Compartir proyecto', 'Actualizar avance', and 'Replanificar Proyecto'. The main content area is titled '999.TEST Implementación Cliente Demo' and shows a progress bar at 0% for both 'PROGRESO POR HORAS' and 'PROGRESO POR TAREAS'. Below the progress bars, there are fields for 'Clave' (99910), 'Cliente', 'Etiquetas', 'Proyecto de soporte' (unchecked), 'Compañía' (Desarrollo Suit), 'Gerente de proyecto' (Administrator), 'Responsable técnico', 'Arquitecto jefe', 'Fecha de inicio' (11 oct), 'Fecha de finalización' (30 oct), and 'Tiempo planificado' (108:00). At the bottom, there are tabs for 'Descripción', 'Alcance y Tiempos', 'Información de auditoría', 'Información de Seguimiento', 'Objetivos', and 'Ajustes'. The 'Descripción' tab is active, showing the text 'Implementación estándar de la Suite: arranque, requerimientos, diseño, configuración, capacitación y puesta en marcha.' On the right side, there is a sidebar with a 'Mensaje' section showing a message from 'Administrator' dated '10 oct 2026' with the text 'Proyecto creado desde la plantilla 999.TEST Plantilla Implementación ERP.'

Desde la ficha del proyecto, el botón Replanificar abre el asistente para mover todo el plan.

Ruta: Proyecto › Replanificar Proyecto

El asistente de replanificación

Proyecto · encuentro 2 · Replanificar un proyecto

Replanificar Proyecto

Nombre de la Tarea ?

Replanificar Hasta ?

Punto de Partida ? Inicio del Proyecto

Fecha del Punto de Partida ? 11 oct

Motivo de Replanificación ? Explica por qué se está ejecutando esta replanificación...

Tareas Afectadas

Quita una fila para excluir esa tarea de esta replanificación. Las filas marcadas como "Dependencia" se predice que se moverán como consecuencia de otra tarea que se mueve, no porque se seleccionaron directamente - quitar una de esas filas no evita que se mueva de verdad.

Tarea	Inicio Anteri...	Fin Anterior	Nuevo Inicio	Nuevo Fin	Desplaz...	Dependencia

Replanificar Cancelar

El asistente pide el nombre de la tarea de replanificación, la fecha hasta la que se mueve, el punto de partida y el motivo.

[Ruta: Replanificar Proyecto › datos del asistente](#)

Práctica 1: abre el asistente de replanificación

Proyecto · encuentro 2 · Replanificar un proyecto

PRÁCTICA

20 min en total

Con el proyecto de ejemplo 999.TEST, simula que el cliente pide mover la entrega una semana.

- 1 Abre el proyecto de ejemplo y pulsa Replanificar Proyecto.
- 2 Captura el nombre de la tarea y la fecha hasta la que se mueve.
- 3 Elige el punto de partida.
- 4 Escribe el motivo del cambio.
- 5 Revisa la tabla de tareas afectadas antes de confirmar.

SE LOGRA CUANDO

- El equipo conoce los datos que pide el asistente.
- El motivo del cambio queda por escrito.

Tareas afectadas por el cambio

Proyecto · encuentro 2 · Tareas afectadas y dependencias

Replanificar Proyecto

Nombre de la Tarea: Replanificación por cambio de alcance

Replanificar Hasta: 19 oct

Punto de Partida: Inicio del Proyecto

Fecha del Punto de Partida: 11 oct

Motivo de Replanificación: El cliente pidió mover la entrega una semana

Tareas Afectadas

Quita una fila para excluir esa tarea de esta replanificación. Las filas marcadas como "Dependencia" se predice que se moverán como consecuencia de otra tarea que se mueve, no porque se seleccionaron directamente - quitar una de esas filas no evita que se mueva de verdad.

Tarea	Inicio Anterior	Fin Anterior	Nuevo Inicio	Nuevo Fin	Desplaz...	Dependencia
-0013 - Configurar módulos comerciales	20 oct	22 oct	27 oct	29 oct	7	
-0014 - Configurar contabilidad	23 oct	26 oct	30 oct	2 nov	7	
99910-0001 - Reunión de arranque	12 oct	12 oct	19 oct	19 oct	7	
99910-0002 - Levantar requerimientos	13 oct	15 oct	20 oct	22 oct	7	
99910-0003 - Diseñar la solución	16 oct	19 oct	23 oct	26 oct	7	
99910-0004 - Configurar el sistema	12 oct	16 oct	19 oct	23 oct	7	
99910-0005 - Capacitar a los usuarios	19 oct	20 oct	26 oct	27 oct	7	
99910-0006 - Puesta en marcha	21 oct	21 oct	28 oct	28 oct	7	

Replanificar Cancelar

La tabla lista las tareas que se mueven, con su inicio y fin anteriores, sus nuevas fechas y su dependencia.

Ruta: [Replanificar Proyecto](#) › [Tareas afectadas](#)

Fechas nuevas y dependencias

Proyecto · encuentro 2 · Tareas afectadas y dependencias

Replanificar Proyecto

Nombre de la Tarea: Replanificación por cambio de alcance

Replanificar Hasta: 19 oct

Punto de Partida: Inicio del Proyecto

Fecha del Punto de Partida: 11 oct

Motivo de Replanificación: El cliente pidió mover la entrega una semana

Tareas Afectadas

Quita una fila para excluir esa tarea de esta replanificación. Las filas marcadas como "Dependencia" se predice que se moverán como consecuencia de otra tarea que se mueve, no porque se seleccionaron directamente - quitar una de esas filas no evita que se mueva de verdad.

Tarea	Inicio Anterior	Fin Anterior	Nuevo Inicio	Nuevo Fin	Desplaz...	Dependencia
-0013 - Configurar módulos comerciales	20 oct	22 oct	27 oct	29 oct	7	☐
-0014 - Configurar contabilidad	23 oct	26 oct	30 oct	2 nov	7	☐
99910-0001 - Reunión de arranque	12 oct	12 oct	19 oct	19 oct	7	☐
99910-0002 - Levantar requerimientos	13 oct	15 oct	20 oct	22 oct	7	☐
99910-0003 - Diseñar la solución	16 oct	19 oct	23 oct	26 oct	7	☐
99910-0004 - Configurar el sistema	12 oct	16 oct	19 oct	23 oct	7	☐
99910-0005 - Capacitar a los usuarios	19 oct	20 oct	26 oct	27 oct	7	☐
99910-0006 - Puesta en marcha	21 oct	21 oct	28 oct	28 oct	7	☐

Replanificar Cancelar

Las filas marcadas como Dependencia se mueven como consecuencia de otra tarea; se puede quitar una fila para que no se mueva.

Ruta: Tareas afectadas · columnas Nuevo inicio, Nuevo fin y Dependencia

Práctica 2: revisa el impacto antes de confirmar


Proyecto · encuentro 2 · Tareas afectadas y dependencias

PRÁCTICA

15 min en total

Antes de confirmar, revisa con el cliente qué tareas se mueven y cuáles no deberían.

- 1 Abre la tabla de tareas afectadas.
- 2 Compara el inicio anterior con el nuevo inicio.
- 3 Identifica las tareas marcadas como dependencia.
- 4 Decide si alguna fila debe quitarse.

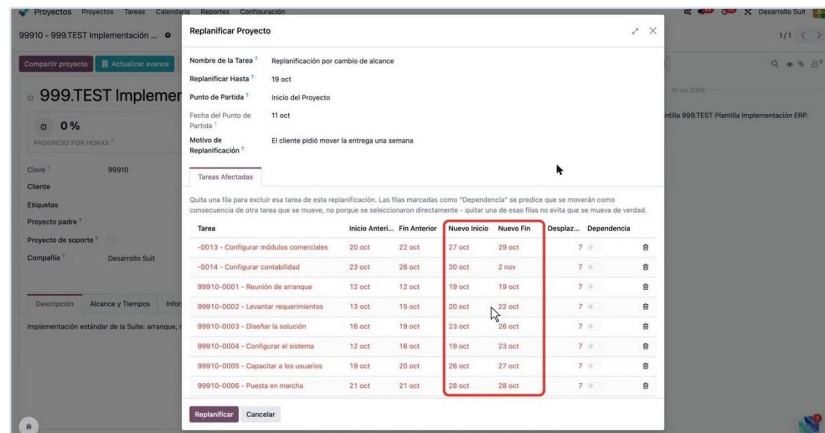


SE LOGRA CUANDO

- El cliente entiende qué tareas se mueven y por qué.
- Se acordó qué filas se quitan, si hay alguna.

Historial de replanificación

Proyecto · encuentro 2 · Historial y ruta crítica

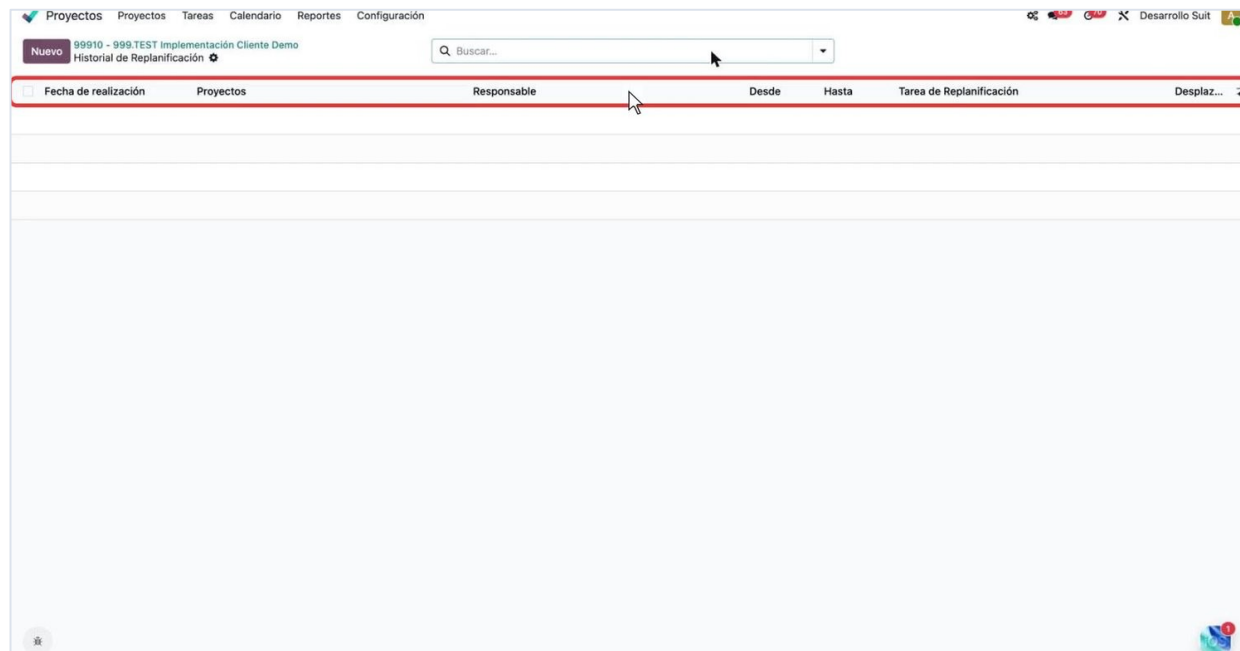

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing links for 'Proyectos', 'Tareas', 'Calendario', 'Reportes', and 'Configuración'. Below the navigation bar is a header section with a 'Nuevo' button, a breadcrumb trail '99910 - 999.TEST Implementación Cliente Demo > Historial de Replanificación', and a search bar labeled 'Buscar...'. The main content area is a table with a red header row. The table has columns for 'Fecha de realización', 'Proyectos', 'Responsable', 'Desde', 'Hasta', 'Tarea de Replanificación', and 'Desplaz...'. The table body is currently empty, showing only the header and a few empty rows. A mouse cursor is hovering over the 'Responsable' column header. In the bottom right corner of the table area, there is a small icon of a person with a red notification bubble.


Fecha de realización	Proyectos	Responsable	Desde	Hasta	Tarea de Replanificación	Desplaz...

Cada replanificación queda registrada con su fecha, el proyecto, el responsable y la tarea creada.

Ruta: [Proyectos](#) › [Reportes](#) › [Historial de replanificación](#)

Ruta crítica en el Gantt

Proyecto · encuentro 2 · Historial y ruta crítica

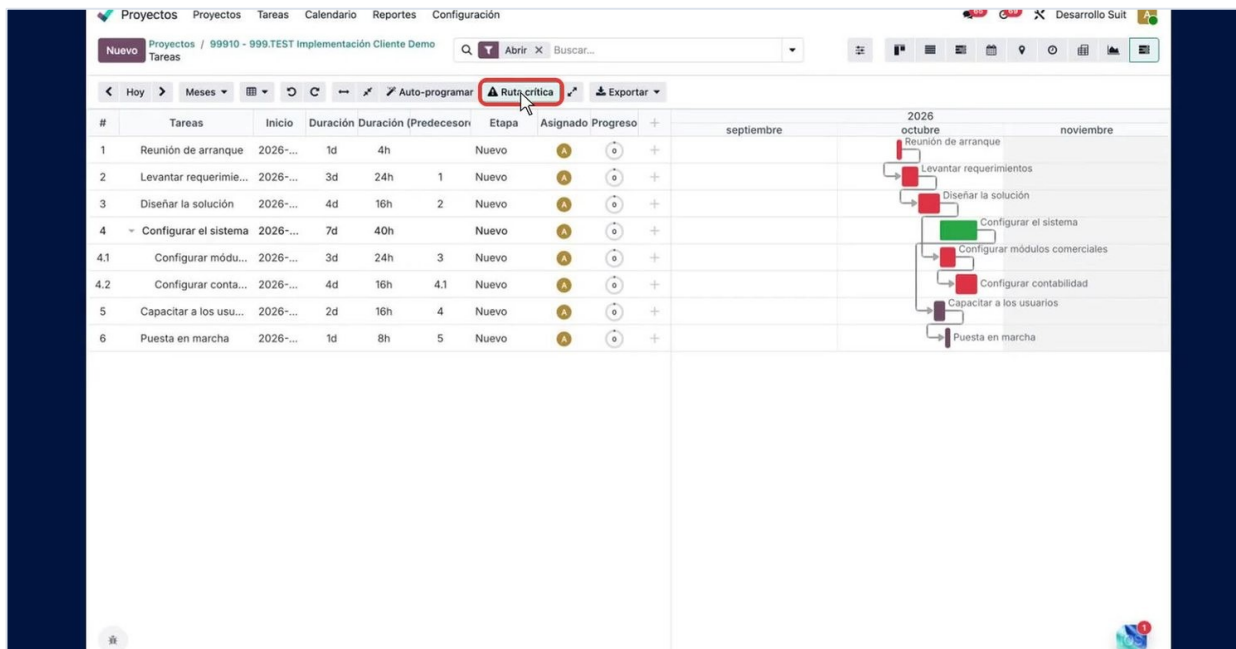

El botón Ruta crítica marca en rojo las tareas que no pueden retrasarse sin atrasar el proyecto.

Ruta: Proyecto › Tareas › Gantt › Ruta crítica

Caso: ¿quién autorizó el cambio y qué vigilar ahora?


Proyecto · encuentro 2 · Historial y ruta crítica

PRÁCTICA

15 min · Caso

El cliente pregunta quién movió las fechas y qué tareas debe cuidar después del cambio.

- 1 Abre el historial de replanificación.
- 2 Localiza el cambio y su motivo.
- 3 Abre el Gantt del proyecto.
- 4 Activa Ruta crítica y anota las tareas en rojo.

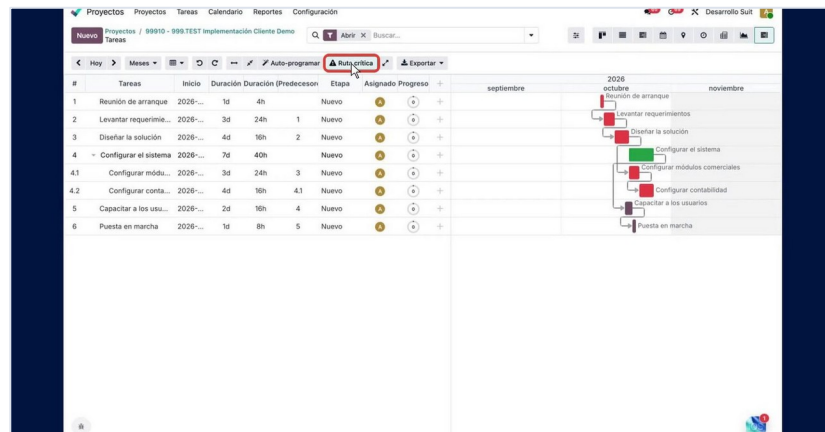

SE LOGRA CUANDO

- Se identificó quién y por qué movió el plan.
- Se acordó qué tareas críticas vigilar.

Alcance y tiempos

Proyecto · encuentro 2 · Tiempos, progreso y variaciones

The screenshot displays the Soltein project management interface. The top navigation bar includes 'Proyectos', 'Tareas', 'Calendario', 'Reportes', and 'Configuración'. The main header shows the project name '999.TEST Implementación Cliente Demo' and a progress bar at 0%. Below this, there are tabs for 'Compartir proyecto', 'Actualizar avance', and 'Replanificar Proyecto'. The 'Alcance y tiempos' tab is selected, showing a table with columns: Descripción, Alcance y tiempos, Información de auditoría, Información de Seguimiento, Objetivos, and Ajustes. The table contains four rows: 'Días naturales', 'Días laborables', 'Tiempo restante', and 'Retraso del proyecto'. A red box highlights the 'Alcance y tiempos' column for these four rows. The right sidebar shows a message from the Administrator dated 10 oct 2026, stating 'Proyecto creado desde la plantilla 999.TEST Plantilla Implementación ERP.'

Descripción	Alcance y tiempos	Información de auditoría	Información de Seguimiento	Objetivos	Ajustes
Días naturales	año(s) 0		mes(es) 0		día(s) 15
Días laborables	11				
Tiempo restante	año(s) 0		mes(es) 0		día(s) 0
Retraso del proyecto	año(s) 0		mes(es) 0		día(s) 0

PROGRESO
Tiempo ejecutado: 00:00

VARIACIONES DEL PROYECTO
Variación Promedio de: 0.00

La pestaña Alcance y tiempos muestra los días naturales y laborables, el tiempo restante y el retraso del proyecto.

Ruta: Proyecto › pestaña Alcance y tiempos

Progreso del proyecto

Proyecto · encuentro 2 · Tiempos, progreso y variaciones

Proyectos Tareas Calendario Reportes Configuración

99910 - 999.TEST Implementación ...

Tasks 0 / 8 (0%) Ver horas 0 Etapas Ruta crítica Historial de Replanificación Objetivos Dashboard 0 Estado

1/1 < >

Compartir proyecto Actualizar avance Replanificar Proyecto

Por hacer 1d y 53min En progreso ... Mensaje Nota Actividad

Proyecto de soporte ? ☐

Compañía ? Desarrollo Suit Fecha de finalización ? 30 oct

Tiempo planificado 108:00

Descripción	Alcance y Tiempos	Información de auditoría	Información de Seguimiento	Objetivos	Ajustes
Días naturales ?	año(s) 0	mes(es) 0	dia(s) 15		
Días laborables ?	11				
Tiempo restante ?	año(s) 0	mes(es) 0	dia(s) 0		
Retraso del proyecto ?	año(s) 0	mes(es) 0	dia(s) 0		

PROGRESO

Tiempo ejecutado ? 00:00

Progreso por horas ? 0 %

Total de tareas 8

Total de tareas completadas 0

Progreso por tareas ? 0 %

VARIACIONES DEL PROYECTO

Variación Promedio de Planificación (días) ? 0.00

Variación Máxima de Planificación (días) ? 0.00

Variación Mínima de Planificación (días) ? 0.00

Variación Promedio de Planificación (horas) ? 0.00

Variación Máxima de Planificación (horas) ? 0.00

Variación Mínima de Planificación (horas) ? 0.00

10 oct 2026

Administrator 10 oct, 11:52 p.m.

Proyecto creado desde la plantilla 999.TEST Plantilla Implementación ERP.

El bloque Progreso compara las horas ejecutadas con las planificadas y cuenta las tareas completadas.

[Ruta: Proyecto > Progreso](#)

Variaciones del proyecto

Proyecto · encuentro 2 · Tiempos, progreso y variaciones

The screenshot displays the Soltein project management interface. The top navigation bar includes 'Proyectos', 'Tareas', 'Calendario', 'Reportes', and 'Configuración'. The main header shows the project name '99910 - 999.TEST Implementación ...' and a progress indicator 'Tasks 0 / 8 (0%)'. Below this, there are tabs for 'Compartir proyecto', 'Actualizar avance', and 'Replanificar Proyecto'. The 'Replanificar Proyecto' tab is active, showing a timeline with 'Por hacer 1d y 53min' and 'En progreso'. The project details section includes 'Proyecto de soporte?' (checked), 'Compañía?' (Desarrollo Suit), 'Fecha de finalización?' (30 oct), and 'Tiempo planificado' (108:00). A table with columns 'Descripción', 'Alcance y Tiempos', 'Información de auditoría', 'Información de Seguimiento', 'Objetivos', and 'Ajustes' is visible. The 'Alcance y Tiempos' column shows 'Días naturales?' (año(s) 0, mes(es) 0, día(s) 15), 'Días laborables?' (11), 'Tiempo restante?' (año(s) 0, mes(es) 0, día(s) 0), and 'Retraso del proyecto?' (año(s) 0, mes(es) 0, día(s) 0). The 'PROGRESO' section shows 'Tiempo ejecutado?' (00:00), 'Progreso por horas?' (0%), 'Total de tareas' (8), 'Total de tareas completadas' (0), and 'Progreso por tareas?' (0%). A red box highlights the 'VARIACIONES DEL PROYECTO' table, which lists various metrics and their values (all 0.00):

VARIACIONES DEL PROYECTO	
Variación Promedio de Planificación (días) ?	0.00
Variación Máxima de Planificación (días) ?	0.00
Variación Mínima de Planificación (días) ?	0.00
Variación Promedio de Planificación (horas) ?	0.00
Variación Máxima de Planificación (horas) ?	0.00
Variación Mínima de Planificación (horas) ?	0.00

Las variaciones muestran cuánto se desvía el proyecto contra lo planeado, en días y en horas.

[Ruta: Proyecto > Variaciones del proyecto](#)

Práctica 3: lee el estado de un proyecto

Proyecto · encuentro 2 · Tiempos, progreso y variaciones

PRÁCTICA

20 min en total

Con el proyecto de ejemplo, explica al cliente cómo va el proyecto sin abrir cada tarea.

1 Abre la pestaña Alcance y tiempos y lee días y retraso.

2 Revisa el bloque Progreso: horas y tareas completadas.

3 Revisa las variaciones contra lo planeado.

4 Anota qué indicador seguirá el gerente cada semana.

SE LOGRA CUANDO

- El cliente lee el estado del proyecto desde una sola ficha.
- Se acordó el indicador semanal.

Objetivos del proyecto

Proyecto · encuentro 2 · Objetivos y cuenta analítica

The screenshot displays the Soltein project management interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Proyectos', 'Tareas', 'Calendario', 'Reportes', and 'Configuración'. Below this, the project name '99910 - 999.TEST Implementación ...' is shown. The interface is divided into several sections: a top summary bar with 'Compartir proyecto', 'Actualizar avance', and 'Replanificar Proyecto'; a main details area with project metadata (Clave, Cliente, Etiquetas, etc.) and a table of tasks; and a right sidebar with a message from the Administrator.

Project Metadata:

- Clave: 99910
- Gerente de proyecto: Administrator
- Fecha de inicio: 11 oct
- Fecha de finalización: 30 oct
- Tiempo planificado: 108:00

Task Table:

Referencia	Nombre	# tareas	Tareas c...	Tiempo planificado	Progreso por hora
	Arranque	2	0	28:00	0 %
	Diseño y configuración	4	0	56:00	0 %
	Entrega	2	0	24:00	0 %
		8	0	108:00	

Los objetivos agrupan las tareas: cada uno muestra su número de tareas, sus horas planificadas y su avance.

Ruta: Proyecto › pestaña Objetivos

Cuenta analítica del proyecto

Proyecto · encuentro 2 · Objetivos y cuenta analítica

The screenshot displays the Soltein project management interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Proyectos', 'Tareas', 'Calendario', 'Reportes', and 'Configuración'. Below this, a sub-header shows the project name '99910 - 999.TEST Implementación ...' and various filters like 'Tasks 0 / 8 (0%)', 'Ver horas', 'Etapas', 'Ruta crítica', 'Historial de Replanificación', 'Objetivos', and 'Dashboard 0 Estado'. The main content area is titled '999.TEST Implementación Cliente Demo' and shows progress bars for 'PROGRESO POR HORAS' and 'PROGRESO POR TAREAS', both at 0%. Below these are fields for 'Clave', 'Cliente', 'Etiquetas', 'Proyecto padre', 'Proyecto de soporte', and 'Compañía'. To the right, there's a section for project details including 'Gerente de proyecto', 'Responsable técnico', 'Arquitecto jefe', 'Fecha de inicio', 'Fecha de finalización', and 'Tiempo planificado'. At the bottom, there's a table with tabs for 'Descripción', 'Alcance y Tiempos', 'Información de auditoría', 'Información de Seguimiento', 'Objetivos', and 'Ajustes'. The 'Ajustes' tab is active, and the 'ANALÍTICO' section is highlighted with a red box, showing 'Cuenta del proyecto' set to '999.TEST Implementación Cliente Demo'.

En Ajustes, el bloque Analítico asigna la cuenta analítica del proyecto, base para analizar sus costos.

Ruta: Proyecto › pestaña Ajustes › Analítico

El secreto: funciones del proyecto

Proyecto · encuentro 2 · Objetivos y cuenta analítica

The screenshot displays the Soltein project management software interface. The top navigation bar includes tabs for 'Proyectos', 'Tareas', 'Calendario', 'Reportes', and 'Configuración'. Below this, a breadcrumb trail shows '99910 - 999.TEST Implementación ...'. The main content area is divided into several sections. On the left, there are settings for 'Compartir proyecto', 'Actualizar avance', and 'Replanificar Proyecto'. The central part of the screen shows project details for 'ANALITICO', including 'Cuenta del proyecto' and '999.TEST Centros de costo'. On the right, there is a 'Mensaje' section with a message from the 'Administrator' dated '10 oct 2026'. At the bottom, there are two sections: 'GESTIÓN DE TAREAS' and 'VENTAS Y FACTURACIÓN'. The 'GESTIÓN DE TAREAS' section is highlighted with a red box and contains three checkboxes: 'Tareas recurrentes' (unchecked), 'Dependencias de las tareas' (checked), and 'Objetivos' (checked). The 'VENTAS Y FACTURACIÓN' section contains one checkbox: 'Facturable' (unchecked).

Las casillas de Ajustes activan funciones como dependencias de las tareas y objetivos; sin ellas, esas opciones no aparecen.

Ruta: Proyecto › Ajustes › Gestión de tareas

Práctica 4: objetivos y cuenta analítica


Proyecto · encuentro 2 · Objetivos y cuenta analítica

PRÁCTICA

20 min en total

Deja el proyecto del cliente listo para medir avance y costos.

- 1 Abre la pestaña Objetivos y revisa horas y tareas por objetivo.
- 2 En Ajustes confirma las casillas de dependencias y objetivos.
- 3 Revisa la cuenta analítica del proyecto.
- 4 Anota qué centros de costo faltan.

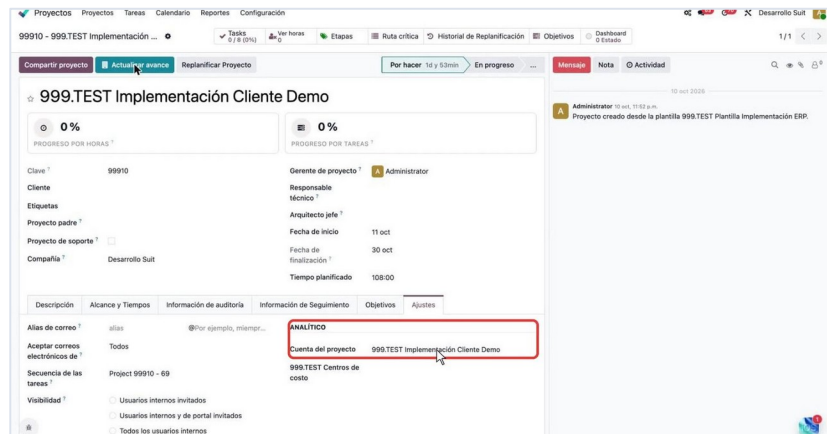

SE LOGRA CUANDO

- Los objetivos miden el avance por fase.
- La cuenta analítica está lista para analizar costos.

Cierre: acuerdos de uso y tareas

Proyecto · encuentro 2 · Cierre

Acuerdos de uso

Quién replanifica, con qué motivo se documenta y qué indicadores se revisan cada semana.

Tareas para la semana

Probar una replanificación en el proyecto de ejemplo y leer el estado de un proyecto real.

Pendientes de configuración

Objetivos, casillas de funciones y cuenta analítica que faltan: qué falta y quién lo define.

Lo que debes recordar

Proyecto · encuentro 2 · Cierre

1

Replanificar

Mueve el plan con fecha y motivo.

2

Impacto

Se revisan las tareas afectadas antes de confirmar.

3

Seguimiento

Tiempos, progreso y variaciones en una ficha.

4

Costos

Objetivos y cuenta analítica.

Pendientes por validar y fuentes

Proyecto · encuentro 2

PENDIENTES POR VALIDAR CON EL EQUIPO FUNCIONAL

- La replanificación se mostró solo hasta la tabla de tareas afectadas, sin confirmarla; el historial del video aparece vacío.
- El análisis de costos y rentabilidad no estaba disponible en el ambiente de pruebas: se mostró solo la cuenta analítica.
- El proyecto de ejemplo es 999.TEST Implementación Cliente Demo; todos los datos son de prueba.
- En el cierre del video 3 se anuncia «Costos y rentabilidad»; el video 4 quedó como seguimiento, objetivos y costos.

DE DÓNDE SALE ESTE CONTENIDO

- Videos Proyecto 3 (replanificación y ruta crítica) y 4 (seguimiento, objetivos y costos), versiones con voz
- ficha-video.md y texto-para-voz.txt de cada video
- Temario: doc-videos-encuentros-saas-2026-09-v2.0.docx (Proyecto, encuentro 2)
